




糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。  
朝晩の寒さが身に染みるようになってきました。市民の皆様の良い庁舎がお届けできるように  
安全第一、第三者最優先、笑顔、元気をモットーに工事を進めています。  
工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

### ■工事の状況

10月は、建物のカギとなる免震装置を中央部分を除いて47台設置しました。完了した場所から免震階の柱、梁を作成する工事に移行しました。また、地下工事を効率よく進めるため残っていた中央部分の土留壁を撤去して掘削工事、基礎工事に着手しました。

- ・今までお世話になった土留壁の撤去方法の紹介です。  
土留壁のおかげで地下工事を安全に進めることが出来ました。

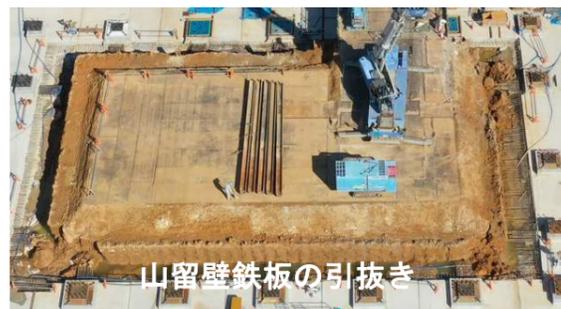

### ■工事予定表

今月の TOPIC 3

令和4年度	前月(10月)				当月(11月)				来月(12月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
掘削工事	←→				←→							
免震基礎工事	←→						←→					
免震装置設置	←→								←→			
地下1階工事					←→				←→			
1階工事									←→			

### ■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）
