



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

今年も早いもので1か月が経過しました。市民の皆様には素晴らしい庁舎をお届けできるように

安全第一、第三者最優先、笑顔、元気、あいさつをモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ■工事の状況



1月は、1階部分の型枠、鉄筋工事を中心に進めました。

今後、地上6階の新庁舎が建ち上がる姿が見えてきますので、市民の皆様も工事の進捗を実感できるようになります。

先月号（1月号）では、4階と5階の床に設置するPC床版をご紹介しました。

今月号では、東面、西面の外壁となるPC外壁をご紹介します。長さは約4m、重さ約3t有ります。現場には、6月末から搬入して取り付けていきます。現在専用工場で作成し取り付けに向けて準備をしています。PC外壁が出来上がるまでの手順を紹介します。

今月の  
TOPIC 1

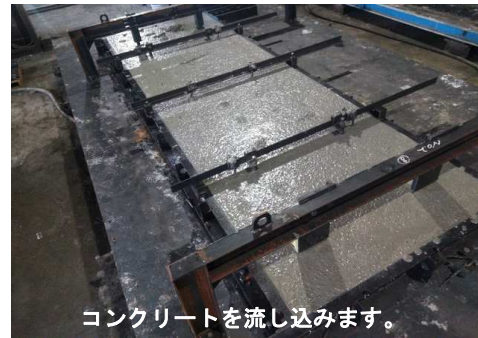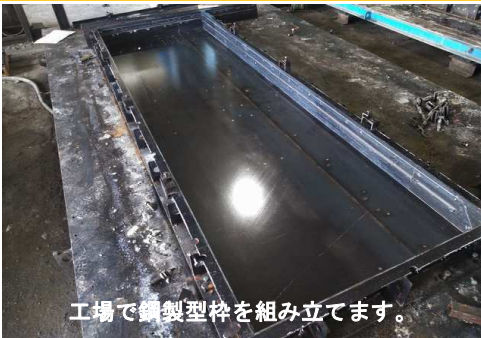

## ■工事予定表

今月の  
TOPIC 2

令和5年度	前月(1月)				当月(2月)				来月(3月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
地下1階工事	→											
1階工事	→				→							
2階工事							→					
3階工事										→		

## ■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）
