



窓から見える新緑が眩しい初夏を迎えられことを嬉しく思います。

糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。

新年度も今までと同様、安全第一、第三者最優先、笑顔、あいさつをモットーに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。


## ■工事の状況

3階床部分のコンクリート工事が完了し、4階の柱や壁の型枠、鉄筋工事を実施しています。また、4月中旬より1階仕上げ工事に着手しました。5月からは上層階の躯体工事と低層階の仕上げ工事を並行して進めていきます。

### 仕上げ工事の内容を紹介します。

免震ピット内の配管からスタートして、1階へ進んできました。  
1階は高所で行う作業です。高所作業車で足場を確保して安全に作業を進めています。  
空間が広いので、いろんな道具を駆使して作業が行えます。

今月の  
TOPIC

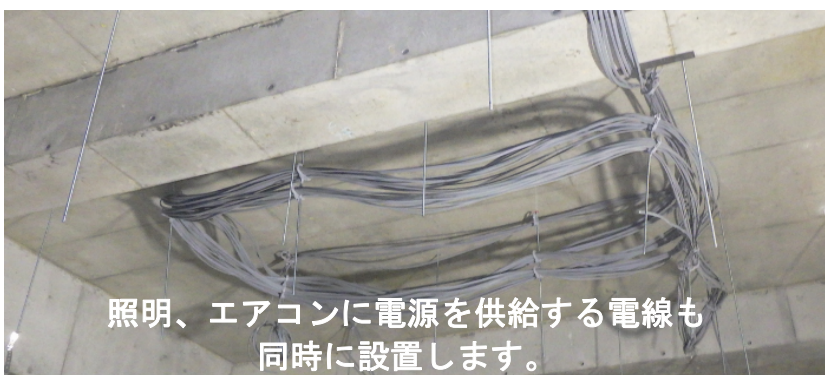

## ■工事予定表

令和5年度	前月(4月)				当月(5月)				来月(6月)					
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目		
1階仕上げ工事			←————→											
2階仕上げ工事					←————→									
3階仕上げ工事											←————→			
3階躯体工事	————→													
4階躯体工事			←————→											
5階躯体工事						←————→								
6階躯体工事											←————→			

## ■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）
