



糸島市新庁舎建設工事の進捗状況、今後の予定などについてお知らせします。


朝夕は秋の気配が感じられるようになってきました。市民の皆様の良い庁舎がお届けできるように  
安全第一、第三者最優先、笑顔をもっとに工事を進めています。

工事期間中は、大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ■工事の状況

8月は、建物を支える基礎コンクリート工事を主体で行いました。非常に重要な部分になりますので、作業員一丸となって取り組みました。

コンクリートを流し込む作業においては、天候にも恵まれて品質の良い基礎を作成することが出来ました。

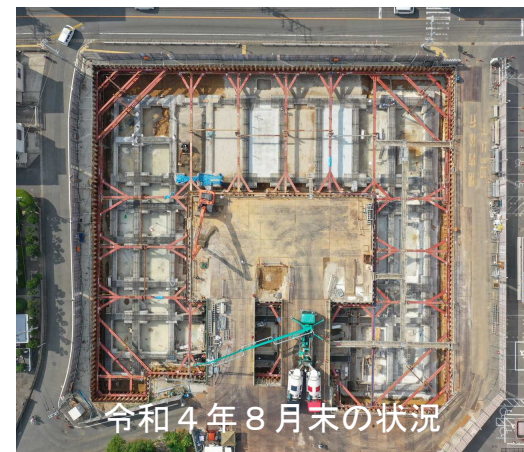

・基礎鉄筋を組み立てた後、型枠を入れてコンクリートを流し込みます。30m以上のブームを伸ばすことのできるコンクリートポンプ車を利用して作業します。この作業は、基礎の品質を決定する重要なポイントになります。

・工事で頼りになる機械たちの紹介です。


- ①コンクリートポンプ車（コンクリートを流し込みます）
- ②バックホーロングブーム仕様（土を埋め戻します）
- ③25tラフタークレーン（鉄筋、型枠材を荷揚げします）
- ④120tクローラクレーン（各種材料を荷揚げします）



今月の  
TOPIC 1



今月の  
TOPIC 2

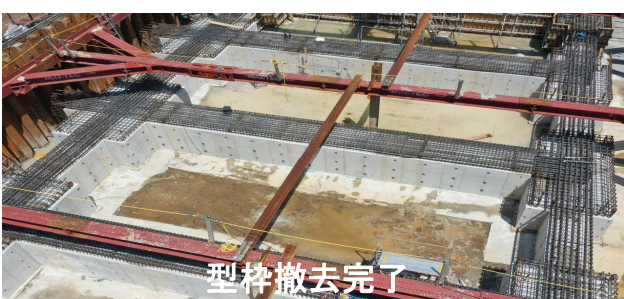

## ■工事予定表

今月の  
TOPIC 3

令和4年度	前月(8月)				当月(9月)				来月(10月)			
	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目	1週目	2週目	3週目	4週目
掘削工事			←→		←→				←→			
免震基礎工事	←→				←→							
免震装置設置							←→					
地下1階工事									←→			

## ■緊急連絡先

工事現場事務所：092-332-8571（施工者：村本建設株式会社）
